GROEPENKAST DUITLAAN 20

Meterkast woning - bijgewerkt 26-10-2026

3 x 25 A AANSLUITING | **B16** ALLE GROEPEN | **3** AARDLEKSCHAKELAARS

Stop 13 HOOFDSCHAKELAAR — **Faseschakelaars: L2 links - L3 midden - L1 rechts**

ENKELFASE-GROEPEN PER AARDLEKSCHAKELAAR

L1 — Stop 14 - Aardlek 1

RECHTS IN DE METERKAST

17	AardLekSchakelaar
18	
19	• WCD in muur achter keukenwandkast (ongebruikt)
20	• Hal • Toilet beneden • Keukennis WCD linkerzijde • Overloop • Slaapkamers Ivan & Taeke • Computer zolder • Mechanische ventilatie • Zolderplafondlicht
21	• Meterkast stopcontact rechtsboven • Internet/wifi/glasvezel • Home Assistant • Deurbel • Garage (licht, koelkast, roldeur) • Buitenlamp rechterzijgevel • Slaapkamers achterzijde (Rob & Sonia, Aukje) • Badkamerverlichting (excl. WCD achter deur) • WCD zolder (staande vloerlamp)
22	• Stopcontacten keukenmuur • Keukenvriezer • Keukenkoelkast • Keukenlicht • WCD terras • Rookmelder hal • Ingebouwde deurbel meterkast (ongebruikt)

L2 — Stop 15 - Aardlek 2

LINKS IN DE METERKAST

1	AardLekSchakelaar
2	
3	• Quooker pulsen ~2,1 kW
4	• Woonkamer • Tuinverlichting • Laadpaalsensoren • Meterkast stopcontact linksboven
5	• Combimagnetron
6	• Koffiemachine • Keukennis WCD rechterzijde

L3 — Stop 16 - Aardlek 3

MIDDEN IN DE METERKAST

7	AardLekSchakelaar
8	
9	• **ALARM** • Vaatwasser
10	• WCD achter badkamerdeur
11	• Droger
12	• Wasmachine

HOMEWIZARD KLEUREN

MEERFASE-VERBRUIKERS MET EIGEN AANSLUITING

VERBRUIKER	L1	L2	L3	BELASTING
Zonnepanelen + Enphase Q-relay	●	●	●	Opwek verdeeld: ~37% L1, ~27% L2, ~36% L3
Inductiekookplaat	●	○	●	2 fasen, gemeten via P1
Warmtepomp: compressor	◌	●	◌	Alleen L2: +0,6 tot 1,4 kW. L1 en L3 aangesloten, niet belast
Warmtepomp: elektrisch element	●	○	●	L1 + L3, ~2,0 kW per fase, samen ~4 kW
Laadpaal garage (EV-Rob)	●	●	●	Passat laadt op L2 (1 fase)
Laadpaal voordeur (EV-Sonia)	●	●	●	Ioniq 3 fasen; Passat ook hier op L2

● belast of aangesloten en gebruikt ◌ aangesloten, geen belasting

GEMETEN OP 24-10-2026 EN 26-10-2026

P1-FASEN = L1, L2, L3
HomeWizard-app en P1-sensor tonen in dezelfde volgorde en kleur.

VOEDING HOOFDSCHAKELAAR
de hoofdschakelaar (stop 13) krijgt voeding van de onderzijde. De drie draden onderaan, van links naar rechts: links = L2 (paars in HomeWizard), midden = L1 (roze in HomeWizard), rechts = L3 (lichtblauw, door uitsluiting).

QUOOKER OP L2
~51 pulsen per dag van ~10 s en ~2,1 kW, naar schatting ~0,3 kWh per dag.

LABELS METERKAST - OP WARE GROOTTE

Stoppen 1-12 (L2 en L3) - 12 modules = 210 x 34 mm

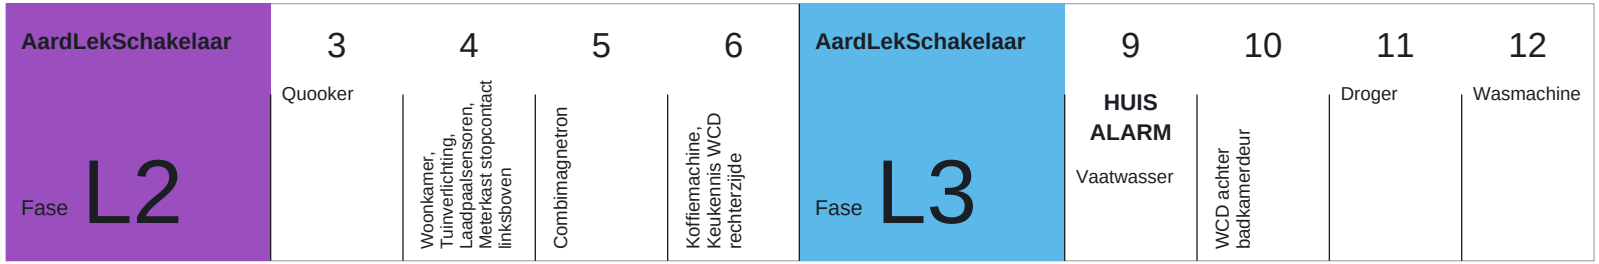

Hoofdschakelaar en stoppen 19-22 (L1) - 12 modules = 210 x 34 mm

Enphase Envoy - 90 x 34 mm



Controle: deze lijn moet precies 100 mm zijn. Print op 100 % (niet 'aanpassen aan pagina'), A4 liggend.

LABELS METERKAST - OP WARE GROOTTE (VERVOLG)

Links boven: zonnepanelen en Enphase - 12 modules = 210 x 34 mm

Zonnepanelen
L1 + L2 + L3

Enphase Q-relay
(Netbeveiligingsrelais)
L1 + L2 + L3

Rechts boven: inductiekookplaat en laadpalen - 12 modules = 210 x 34 mm

Inductiekookplaat
L1 + L3

Laadpaal bij garage (Rob)
Ratio Laadpaal P00000000006589
Laadpaal Code 491238
L1 + L2 + L3

Laadpaal bij voordeur (Sonia)
Ratio Laadpaal P00000000006507
Laadpaal Code 792926
L1 + L2 + L3

Links onder: warmtepomp - 12 modules = 210 x 34 mm

Warmtepomp
• Compressor op **L2**
• Elektrisch element op **L1 + L3**

Rechts onder: overspanningsbeveiliging - 12 modules = 210 x 34 mm

Overspanningsbeveiliging
L1 + L2 + L3

Controle: 100 mm. Print op 100 %, A4 liggend.
