# GROEPENKAST DUITLAAN 20

Meterkast woning - bijgewerkt 26-10-2026

**3 x 25 A** AANSLUITING | **B16** ALLE GROEPEN | **3** AARDLEKSCHAKELAARS

**Stop 13 HOOFDSCHAKELAAR** — **Faseschakelaars: L1 links - L2 midden - L3 rechts**

## ENKELFASE-GROEPEN PER AARDLEKSCHAKELAAR

**HOMEWIZARD KLEUREN**

### L1 — Stop 14 - Aardlek 1

LINKER FASESCHAKELAAR

| | |
|---|---|
| 17<br>18 | AardLekSchakelaar |
| 19 | • WCD in muur achter keukenwandkast (ongebruikt) |
| 20 | • Hal<br>• Toilet beneden<br>• Keukennis WCD linkerzijde<br>• Overloop<br>• Slaapkamers Ivan & Taeke<br>• Computer zolder<br>• Mechanische ventilatie<br>• Zolderplafondlicht |
| 21 | • Meterkast stopcontact rechtsboven<br>• Internet/wifi/glasvezel<br>• Home Assistant<br>• Deurbel<br>• Garage (licht, koelkast, roldeur)<br>• Buitenlamp rechterzijgevel<br>• Slaapkamers achterzijde (Rob & Sonia, Aukje)<br>• Badkamerverlichting (excl. WCD achter deur)<br>• WCD zolder (staande vloerlamp) |
| 22 | • Stopcontacten keukenmuur<br>• Keukenvriezer<br>• Keukenkoelkast<br>• Keukenlicht<br>• WCD terras<br>• Rookmelder hal<br>• Ingebouwde deurbel meterkast (ongebruikt) |

### L2 — Stop 15 - Aardlek 2

MIDDELSTE FASESCHAKELAAR

| | |
|---|---|
| 1<br>2 | AardLekSchakelaar |
| 3 | • Quooker<br>pulsen ~2,1 kW |
| 4 | • Woonkamer<br>• Tuinverlichting<br>• Laadpaalsensoren<br>• Meterkast stopcontact linksboven |
| 5 | • Combimagnetron |
| 6 | • Koffiemachine<br>• Keukennis WCD rechterzijde |

### L3 — Stop 16 - Aardlek 3

RECHTER FASESCHAKELAAR

| | |
|---|---|
| 7<br>8 | AardLekSchakelaar |
| 9 | • **ALARM**<br>• Vaatwasser |
| 10 | • WCD achter badkamerdeur |
| 11 | • Droger |
| 12 | • Wasmachine |

## MEERFASE-VERBRUIKERS MET EIGEN AANSLUITING

| VERBRUIKER | L1 | L2 | L3 | BELASTING |
|---|---|---|---|---|
| **Zonnepanelen + Enphase Q-relay** | ● | ● | ● | Opwek verdeeld: ~37% L1, ~27% L2, ~36% L3 |
| **Inductiekookplaat** | ● | ○ | ● | 2 fasen, gemeten via P1 |
| **Warmtepomp: compressor** | ◌ | ● | ◌ | Alleen L2: +0,6 tot 1,4 kW. L1 en L3 aangesloten, niet belast |
| **Warmtepomp: elektrisch element** | ● | ○ | ● | L1 + L3, ~2,0 kW per fase, samen ~4 kW |
| **Laadpaal garage (EV-Rob)** | ● | ● | ● | Passat laadt op L2 (1 fase) |
| **Laadpaal voordeur (EV-Sonia)** | ● | ● | ● | Ioniq 3 fasen; Passat ook hier op L2 |

● belast of aangesloten en gebruikt ◌ aangesloten, geen belasting

## GEMETEN OP 24-10-2026 EN 26-10-2026

**P1-FASEN = L1, L2, L3**
HomeWizard-app en P1-sensor tonen in dezelfde volgorde en kleur.

**VOEDING HOOFDSCHAKELAAR**
de hoofdschakelaar (stop 13) krijgt voeding van de onderzijde.
links = L2 (paars in HomeWizard),
midden = L1 (roze in HomeWizard),
rechts = L3 (Lichtblauw in Homewizard).

**QUOOKER OP L2**
~51 pulsen per dag van ~10 s en ~2,1 kW, naar schatting ~0,3 kWh per dag.

# LABELS METERKAST - OP WARE GROOTTE

Stoppen 1-12 (L2 en L3) - 12 modules = 210 x 34 mm

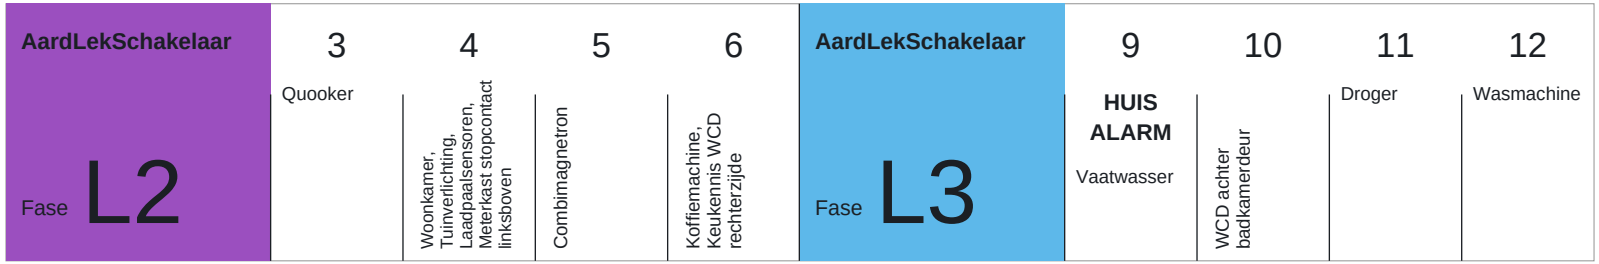


Hoofdschakelaar en stoppen 19-22 (L1) - 12 modules = 210 x 34 mm

Enphase Envoy - 90 x 34 mm

Frontlabel hoofdschakelaar - 70.0 x 12 mm

Fasenlabel L1 L2 L3
134 x 20 mm




Frontlabels automaten B16, B20, B20 - 210 x 10 mm




Controle: deze lijn moet precies 100 mm zijn. Print op 100 % (niet 'aanpassen aan pagina'), A4 liggend.

# LABELS METERKAST - OP WARE GROOTTE (VERVOLG)

Links boven: zonnepanelen en Enphase - 12 modules = 210 x 34 mm

**Zonnepanelen**
**L3 + L1 + L2**

**Enphase Q-relay**
(Netbeveiligingsrelais)
**L3 + L1 + L2**

Rechts boven: inductiekookplaat en laadpalen - 12 modules = 210 x 34 mm

**Inductiekookplaat**
**L1 + L3**

**Laadpaal bij garage (Rob)**
Ratio Laadpaal P00000000006589
*Laadpaal Code 491238*
**L2 + L1 + L3**

**Laadpaal bij voordeur (Sonia)**
Ratio Laadpaal P00000000006507
*Laadpaal Code 792926*
**L2 + L1 + L3**

Links onder: warmtepomp - 12 modules = 210 x 34 mm

**Warmtepomp**
• Compressor op **L2**
• Elektrisch element op **L1 + L3**

Rechts onder: overspanningsbeveiliging - 12 modules = 210 x 34 mm

**Overspanningsbeveiliging**
**L1 + L2 + L3**

Controle: 100 mm. Print op 100 %, A4 liggend.
